


Financiado por

**Iceland
Liechtenstein
Norway grants**



Working together
for a **green**, **competitive**
and **inclusive** Europe!

Trabalhar conjuntamente
por uma Europa, **verde**,
competitiva e **inclusiva**!

PLANO MUNICIPAL
DE ADAPTAÇÃO
ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
DE VILA FRANCA DE XIRA


PMAAC-VFX

Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono
'Programa Ambiente'
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014 – 2021

[08_CALL#3/SGS#3 – Franc@d.PTação](#)

RELATÓRIO FINAL

Período de 01.02.2021 a 31.07.2023

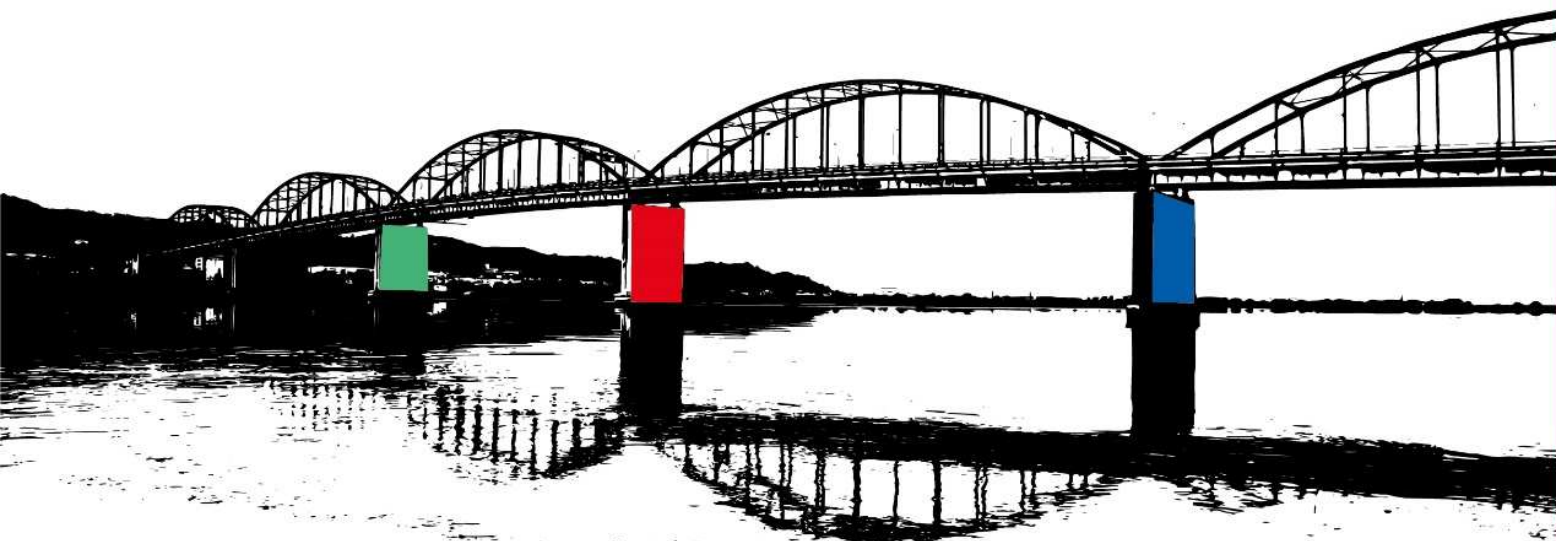

Promotor

Projeto

Operador



CÂMARA
MUNICIPAL

2023,95,I,IN,378 09-08-2023

Franc@d.PTação

Plano Municipal
de Adaptação às Alterações Climáticas
PMAAC-VFX



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AMBIENTE E
AÇÃO CLIMÁTICA

ÍNDICE GERAL

1. GESTÃO DO PROJETO	3
1.1. RECURSOS HUMANOS AFETOS AO PROJETO FRANC@d.PTÇÃO	3
1.2. TAREFAS GERAIS DA EQUIPA	5
1.3. ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO	6
1.4. REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO FRANC@d.PTÇÃO.....	7
2. ATIVIDADE 1 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (PMAAC VFX).....	9
3. ATIVIDADE 2 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO.....	11
3.1. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO. SEMINÁRIOS (2)	11
3.2. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO. WORKSHOPS DE CAPACITAÇÃO COM ATORES ESTRATÉGICOS LOCAIS E TÉCNICOS MUNICIPAIS (4)	11
3.3. OUTRAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO.....	12
4. RESULTADOS ALCANÇADOS	18
4.1. TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO:.....	18
4.2. TAXA DE EXECUÇÃO TÉCNICA	20
5. DESCRIÇÃO DOS CUSTOS E AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO	22
5.1. TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	22
6. DESCRIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS GERAIS DOS EEA GRANTS E DO ‘PROGRAMA AMBIENTE’	24
ANEXO I	27

1

ÍNDICE FIGURAS

FIGURA 1 - EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO FRANC@d.PTÇÃO ATÉ 01.05.2022	3
FIGURA 2 - EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO FRANC@d.PTÇÃO	5
FIGURA 3 – JOGO GIGANTE SOBRE SUSTENTABILIDADE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, DIA DA CRIANÇA, 03.06.2023	14
FIGURA 4 – II FORUM EU MISSION ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE, RONEBY (SUÉCIA)	14
FIGURA 5 – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PMAAC VFX.....	15
FIGURA 6 – PÁGINA WEB DO PMAAC VFX.....	16
FIGURA 7 – PUBLICAÇÃO RESUMO FRANC@d.PTÇÃO.....	16
FIGURA 8 – JOGO PROJETÁVEL PARA SALA DE AULA	16
FIGURA 9 – VÍDEO DIDÁTICO DE APOIO ÀS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	17
FIGURA 10 – CADERNOS PAUTADOS, TAMANHO A5.....	17

De acordo com os Artigos 25º, nº 2, alínea j) e 29º, nº4 do 'Guia para os Candidatos ao Financiamento de Projetos de Ambiente, sobre Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono'

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2993/guia-para-o-financiamento-projetos-eea-grants_programa-ambiente_28112019.pdf

O Projeto [Franc@d.PTação](#), encontra-se em execução física, desde 01 de fevereiro de 2021, contanto com 30 meses de implementação, no Concelho de Vila Franca de Xira.

O presente Relatório de Progresso correspondente ao **Relatório Final do Projeto Franc@d.PTação**, que decorreu de 01.02.2021 a 31.07.2023.

Para uma melhor compreensão das atividades desenvolvidas, optou-se por organizar o presente Relatório Final do Projeto [Franc@d.PTação](#) de acordo com os três grandes grupos refletidos nas três grandes rubricas orçamentais: Gestão do Projeto; Atividade 1 – Elaboração do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Franca de Xira e Atividade 2 – Implementação do Plano de Comunicação do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Franca de Xira.

Ainda em matéria de organização do Relatório Final, esclarece-se que toda a informação apresentada consta dos últimos cinco relatórios intercalares, submetidos durante a vigência do projeto e aprovados pelo Operador do Programa (SGA), com exceção dos dois últimos meses - junho e julho de 2023, cujas atividades são comunicadas no presente documento, razão pela qual, para este período temporal, optou-se por apresentar uma descrição das atividades e fotografias como forma de evidência, à semelhança dos anteriores relatórios intercalares.

Deste ponto de vista, o Relatório Final do Projeto [Franc@d.PTação](#) apresenta uma sistematização das tarefas da equipa, atividades e ações de comunicação, de forma cronológica, tendo-se mantido os *links* das notícias, como evidência. Contudo, como forma de simplificação, optou-se por excluir as figuras (fotografias), na medida em que se trata de um documento que compila 30 meses de projeto, e considerou-se não haver necessidade de repetir as imagens (fotografias) que constam dos anteriores relatórios intercalares, com exceção dos dois últimos meses (junho e julho de 2023), pelo motivo fundamentado supra.

2

1. GESTÃO DO PROJETO

Consideraram-se com atividades associadas à **Gestão do Projeto**, e fazendo uma analogia com as rubricas orçamentais, as horas dispensadas pelos técnicos durante a vigência do projeto, as aquisições de equipamentos e consumíveis, participação em ações de formação e deslocações e estadias no âmbito da capacitação sobre a temática das alterações climáticas.

1.1. RECURSOS HUMANOS AFETOS AO PROJETO FRANC@d.PTÇÃO

Desde a submissão da candidatura, à contratualização com o Operador do Programa (SGA) até ao dia 01.05.2022 a equipa do Projeto [Franc@d.PTção](#) era composta por sete elementos:

- Luis Sousa – Coordenador Geral – 5%
- Inês Belchior – Coordenação Técnica 20%
- Júlia Reis – Apoio à Coordenação Técnica – 10%
- Miguel Falcão – Gestão Financeira – 5%
- Vasco Soares – Design e Comunicação – 5%
- Ana Cristina Santos – Apoio Jurídico – 5%
- Ana Paula Pardal – Apoio Administrativo – 5%



Figura 1 - Equipa Multidisciplinar de acompanhamento do Projeto [Franc@d.PTção](#) até 01.05.2022

A partir de maio de 2022, e decorrente da nova Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais de Vila Franca de Xira, (em vigor desde 16 de abril do presente 2022), foi criada a Unidade de Ambiente e Adaptação às Alterações Climáticas (UAAAC), integrada no Departamento de Ambiente e Espaço Público. A UAAAC reúne competências nas temáticas das alterações climáticas, economia circular e descarbonização, com relevo para a missão de elaborar, promover e implementar o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Vila

Franca de Xira, desenvolvendo o respetivo sistema de monitorização, assegurando o seu acompanhamento e procedendo à sua revisão e atualização.

Em face desta reorganização administrativa, a equipa que acompanha o Projeto Franc@d.PTação sofreu uma pequena alteração. Saíram três elementos:

- Luis Sousa – Coordenador Geral
- Inês Belchior – Coordenação Técnica
- Ana Paula Parda – Apoio Administrativo

Em substituição, entraram três elementos:

- Catarina Conde - Coordenador Geral
- Lara Almeida – Coordenação Técnica
- Ana Catarina Vicente - Apoio Administrativo

Os restantes quatro elementos mantêm-se inalterados desde a submissão e aprovação da candidatura, na generalidade afetos à gestão e às atividades do Projeto [Franc@d.PTação](#) nas áreas das suas competências técnicas.

A equipa de Projeto Franc@d.PTação mantém-se inalterada desde maio de 2022, conforme comunicado no 3º Relatório Intercalar, constituída por sete elementos, afetos à gestão e às atividades do Projeto nas áreas das suas competências técnicas.

O Projeto [Franc@d.PTação](#) é acompanhado multidisciplinarmente por duas unidades orgânicas da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira – a Unidade de Ambiente e Adaptação às Alterações Climáticas (UAAAC), integrada no Departamento de Ambiente e Espaço Público e o Gabinete Multidisciplinar de Prospeção e Investimento (GMPI) pertencente à Direção Municipal de Desenvolvimento do Território, com a seguinte composição e afetação:

- Catarina Conde – Coordenador Geral – 5%
- Lara Almeida – Coordenação Técnica - 20%
- Júlia Reis – Apoio à Coordenação Técnica – 10%
- Miguel Falcão – Gestão Financeira – 5%
- Vasco Soares – Design e Comunicação – 5%
- Ana Cristina Santos – Apoio Jurídico – 5%
- Ana Catarina Vicente – Apoio Administrativo – 5%



Figura 2 - Equipa Multidisciplinar de acompanhamento do Projeto Franc@d.PTação

1.2. TAREFAS GERAIS DA EQUIPA

No decurso do Projeto [Franc@d.PTação](#), a equipa teve sempre tarefas gerais de acompanhamento dos trabalhos e organização administrativa, financeira, acompanhamento técnico, assim como a articulação com o departamento municipal com a competência na divulgação e promoção do projeto, na página WEB e redes sociais.

Entre outras atividades, mais específicas, que serão expostas neste relatório, seguem-se uma lista das tarefas gerais desenvolvidas pelos membros da equipa, nas suas áreas de competência, como sejam:

- Acompanhamento administrativo do Projeto [Franc@d.PTação](#);
- Articulação de procedimentos com setor administrativo, jurídico e financeiro;
- Elaboração de documentação técnica;
- Elaboração de mapas/relatórios, etc.;
- Organização de dossiers e/ou pastas físicas e digital, conteúdos técnicos e/ou administrativos;
- Preenchimento de formulários e/ou fichas, mapas...etc.;
- Preparação de reuniões várias, workshops e atividades junto da comunidade escolar;
- Planeamento de tarefas relacionadas com as Atividades;
- Correspondência com o Operador do Programa (SGA);
- Aprovação dos relatórios das 5 fases do PMAAC VFX;
- Contratualização para aquisição de serviços ou bens;

- Preparação das Verificações Locais do Projeto [Franc@d.PTação](#) com Ana Salgueiro *Consulting for Sustainability*, via *Microsoft Teams* (apresentação e compilação da documentação solicitada).

1.3. ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO

Listagem das tarefas realizadas e adstritas à rubrica Gestão do Projeto, por ordem cronológica:

- ✓ **Primeiro semestre** - Organização e planificação das atividades para contratação externa do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de VFX, em concreto a elaboração de caderno de encargos e das condições técnicas especiais a serem cumprida na contratação externa; Procedimento de contratação externa. Consulta prévia (plataforma SaphetyGov);
- ✓ **09.03.2021 e 28.09.2021** – Reuniões de acompanhamento com o Operador do Programa (SGA);
- ✓ **Setembro 2021** - Envio do Pedido de Pagamento n.º 1
- ✓ **05.11.2021** - Submissão do 1º Relatório Intercalar do projeto (01.02.2021 a 30.09.2021);
- ✓ **27.12.2021** - Envio do Pedido de Pagamento n.º 2
- ✓ **24.02.2022** - 1ª Reunião de Esclarecimento com o Operador do Programa (SGA);
- ✓ **14.03.2022** – Submissão do 2º Relatório Intercalar do projeto (01.10.2021 a 31.01.2022);
- ✓ **10.05.2022** - Participação no fórum de discussão, promovido pelo Operador do Programa (SGA) com o tema Adaptação: da teoria à prática, realizado no dia via Microsoft Teams;
- ✓ **25.07.2022** - Submissão do 3º Relatório Intercalar do Projeto (1.02.2022 a 31.05.2022);
- ✓ **26.07.2022** – Envio do Pedido de Pagamento n.º 3;
- ✓ **27.09.2022** – Reunião de Comunicação Programa Ambiente, promovido pelo Operador do Programa (SGA), via Microsoft Teams;
- ✓ **25.07.2022** - No decorrer do mês de julho foi elaborado o 3º Relatório Intercalar do Projeto [Franc@d.PTação](#) e submetido por email ao Operador do Programa (SGA);
- ✓ **03.08.2022** - Aceitação por parte do operador do programa do 3º Relatório Intercalar do Projeto [Franc@d.PTação](#) – comunicado via email;
- ✓ **13.10.2022** – Verificação Local do Projeto [Franc@d.PTação](#) com Ana Salgueiro *Consulting for Sustainability*, via *Microsoft Teams*;
- ✓ **17.10.2022** – Início do procedimento de Ajuste Direto Regime Simplificado para Aquisição de Serviços – Convite a apresentação de orçamento para a aquisição de vídeos promocionais do PMAAC VFX;
- ✓ **28.11.2022** – Reunião de Acompanhamento Programa Ambiente promovido pelo Operador do Programa (SGA), via *Microsoft Teams*;

- ✓ **29.12.2022** - Envio do Pedido de Pagamento n.º 4;
- ✓ **08.02.2023** – Submissão do 4º Relatório Intercalar do Projeto (1.06.2022 a 31.01.2023);
- ✓ **10.02.2023** - Aceitação por parte do Operador do Programa (SGA) do 4º Relatório Intercalar do Projeto Franc@d.PTação – comunicado via *email*;
- ✓ **10.03.2023** – Estratégia de Marketing e Comunicação EEAGrants, promovido pelo Operador do Programa (SGA), via *Microsoft Teams*;
- ✓ **17.03.2023** – Reprogramação Financeira do Projeto Franc@d.PTação aprovada pelo Operador do Programa (SGA);
- ✓ **25.05.2023** – Verificação Local do Projeto Franc@d.PTação com Ana Salgueiro *Consulting for Sustainability*, via *Microsoft Teams*;
- ✓ **Fevereiro a Junho de 2023** – Aquisição de materiais de apoio e de divulgação para a elaboração da atividade “Sessão na Escola. O Clima e a Adaptação”, realizada a 21 de março 2023; Procedimentos em curso para aquisição de diversos serviços: Serviços de *Graphic Recording* e *Catering* para Seminário de Encerramento a 30 de maio; serviços de tradução do resumo/brochura do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Franca de Xira; Aquisição de materiais pedagógicos para ações de sensibilização junto do público escolar (jogo gigante, vídeo e jogo interativo para sala de aula); Deslocações e estadias no âmbito da capacitação e formação sobre alterações climáticas;
- ✓ **12.06.2023 a 13.06.2023** – Participação de dois elementos da equipa no II Fórum *EU Mission Adaptation to Climate Change*, Roneby, Suécia;
- ✓ **06.07.2023** - Submissão do 5º Relatório Intercalar do Projeto (01.02.2023 a 31.05.2023);
- ✓ **Agosto 2023** - Submissão do Relatório Final do Projeto (01.02.2021 a 31.07.2023);
- ✓ **Agosto 2023** - Envio do Pedido de Pagamento n.º 5

7

1.4. REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO [FRANC@D.PTAÇÃO](mailto:Franc@d.PTação)

O Município de Vila Franca de Xira propôs uma reprogramação financeira do Projeto Franc@d.PTação, aprovada pelo Operador do Programa (SGA) a 17.03.2023 e cuja fundamentação firma-se na realocação de verbas para a concretização de ações de divulgação do *Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Franca de Xira* junto do público infantil/juvenil.

O Município propôs alocar as verbas necessárias à implementação da Atividade 1 e da Gestão do Projeto, garantindo que esta alteração não prejudica a integridade inicialmente contratada do Projeto Franc@d.PTação, tal como detalhe da justificação enviada por *email* e que se transcreve:

Gestão do Projeto:

- Participação de ações de formação e capacitação e aquisição de consumíveis - sem previsão até ao fim do projeto;
- Aquisição de equipamento informático – alocação de verba para aquisição de equipamento de apoio às ações de divulgação do Projeto [Franc@d.PTação](#), em particular em sala de aula, junto do público escolar.

Atividade 1:

- Encargos com workshops, sessões setoriais, acompanhamento na elaboração do PMAAC-VFX - reforço desta rubrica para permitir a concretização de ações de divulgação do Projeto [Franc@d.PTação](#), e da temática alterações climáticas junto do público infantil/juvenil, com aquisição de materiais para atividades em sala de aula (sessão realizada a 21.03.2023); aquisição de materiais pedagógicos para uso ao ar livre (atividade prevista para a comemoração do dia da criança); materiais pedagógicos para utilização em sala de aula; e contratação de serviços de documentação da sessão de encerramento;
Nota: Os materiais a adquirir irão permitir uma utilização e *outputs* que se prolongarão após o *términus* da candidatura, contribuindo para a continuidade do Projeto [Franc@d.PTação](#) e a sua divulgação junto do público estudantil.

8

Atividade 2:

- Encargos com vídeos, folhetos e ferramentas de divulgação (sacos de algodão, lápis, postais ...) – aquisições concluídas de acordo com o plano de comunicação. A equipa considera que as aquisições já efetuadas são suficientes em face das sessões e das atividades previstas;
- Encargos com traduções e brochura - foram revistos em face de orçamentos atualizados;

Quanto ao impacto sobre as atividades, nomeadamente “*se o projeto manterá a sua integridade inicialmente contratada, no que se refere a resultados alcançados e deliverables disponibilizados*”, considera-se que a proposta de reprogramação financeira apresentada contribui para:

- Reforçar o Objetivo 3 do Projeto [Franc@d.PTação](#) – Partilhar e disseminar informação tornando a comunidade mais sensível e consciente para a temática;
- Garantir a sustentabilidade do Projeto [Franc@d.PTação](#) a médio/longo prazo, com a continuidade da sua divulgação junto da comunidade;
- Intensificar os resultados previstos, em face do maior alcance, devido à abrangência da comunidade infantil/juvenil com as novas atividades propostas e específicas para este público-alvo;
- Concretizar os dois indicadores de resultado contratualizados, na medida em que a reprogramação irá permitir a execução de mais ações de divulgação e, consequentemente, um maior número de indivíduos abrangidos.

2. ATIVIDADE 1 - Elaboração do *Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas* (PMAAC VFX)

As tarefas associadas à **Atividade 1 – Elaboração do PMAAC VFX**, e fazendo uma analogia com as rubricas orçamentais, são, para além da elaboração do PMAAC VFX (acompanhamento das cinco fases do Plano, reuniões com a equipa contratada CEDRU e aceitação dos relatórios), também as tarefas inerentes a *workshops* e ações de sensibilização junto do público infantil/ juvenil.

Listagem das tarefas realizadas e adstritas à Atividade 1, por ordem cronológica:

- ✓ **14.06.2021** – Celebração de contrato com CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano;
- ✓ **28.06.2021** – 1ª Reunião técnica com CEDRU para apresentação de equipas e início dos trabalhos;
- ✓ **02.08.2021** – Entrega Fase I. *Relatório de contextualização, objetivos, metodologia, organização e quadro de referência estratégica*;
- ✓ **14.09.2021** - 2ª Reunião técnica com a equipa externa CEDRU – visita ao concelho de Vila Franca de Xira;
- ✓ **03.11.2021** - Entrega Fase II. *Relatório de definição da cenarização bioclimática de base de adaptação*;
- ✓ **06.01.2022** - 3ª Reunião técnica com a equipa externa CEDRU de ponto de situação dos trabalhos e programação das fases seguintes, através da plataforma *zoom*;
- ✓ **26.01.2022** - 4ª Reunião Técnica com a equipa externa CEDRU, através da plataforma *teams*, que teve como objetivos a apreciação geral do documento referente ao Plano de Comunicação apresentado pela CEDRU no âmbito do desenvolvimento do PMAAC VFX, a ponderação sobre os formatos das ações transversais a desenvolver em função dos objetivos e do orçamento do Projeto e a ponderação sobre a forma de desenvolver algumas ações dirigidas;
- ✓ **30.03.2022** – 5ª Reunião Técnica com a Equipa Externa CEDRU/WE Consultans para formalização do vídeo/ spot áudio visual, via Microsoft Teams. Ponderação sobre os formatos de spots audiovisuais a desenvolver em função dos objetivos e do budget do projeto e análise dos possíveis conteúdos técnicos a explorar na mensagem a divulgar, em função da temática associada, em cada um dos spots.
- ✓ **31.03.2022** – Entregue versão preliminar da Fase III. *Avaliação de impactos e de vulnerabilidades setoriais*;
- ✓ **06.04.2022** – 6ª Reunião Técnica com a Equipa Externa CEDRU, para acompanhamento do PMAAC VFX e organização das duas sessões intercalares;

- ✓ **27.05.2022** – 7ª Reunião Técnica com a Equipa Externa CEDRU, através da plataforma *zoom*, e teve como principal objetivo a apreciação geral do relatório da Fase III, sobre a caracterização de impactos e vulnerabilidades atuais e futuras.
- ✓ **26.07.2022** - Aprovação do relatório da Fase III. *Avaliação de impactos e de vulnerabilidades setoriais*;
- ✓ **08.09.2022** – 8ª Reunião Técnica com a Equipa Externa CEDRU e PATER, via *Microsoft Teams* com vista à articulação de conteúdos para a página WEB do PMAAC VFX e esclarecimento como é que o CEDRU/PATER pode ajudar a CMVFX a concretizar o vídeo/spot previsto no plano de comunicação.
- ✓ **07.10.2022** – 9ª Reunião Técnica com a Equipa Externa CEDRU e PATER, através da plataforma *zoom*, e teve como principal objetivo a preparação do #2 workshop interno para técnicos municipais que se realizou a 14.11.2022 na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira.
- ✓ **05.12.2022** – 10ª Reunião Técnica com a Equipa Externa CEDRU, através da plataforma *zoom*, e teve como principal objetivo a apreciação geral do relatório da Fase IV, sobre a estratégia de adaptação e definições de opções, reflexão das linhas de intervenção e medidas de adaptação. Esta reunião teve seguimento no dia 16.12.2022 para conclusão dos assuntos iniciados anteriormente;
- ✓ **05.05.2023** - Aceitação Fase IV do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Franca de Xira
- ✓ **05.05.2023** - Aprovação do relatório da FASE IV, *Estratégia de Adaptação e Definições de Opções*;
- ✓ **01.03.2023** – 11ª Reunião Técnica com a Equipa Externa CEDRU e PATER, através da plataforma *zoom*, e teve como principal objetivo a preparação da atividade “*Sessão na Escola. O Clima e a Adaptação*” e apreciação geral do relatório da Fase IV, sobre a estratégia de adaptação e definições de opções, análise das linhas de intervenção, medidas de adaptação e a compilação das ações, decorrentes dos workshops e dos contributos dos serviços que acompanham o desenvolvimento do PMAAC VFX.
- ✓ **01.04.2023** – 12ª Reunião Técnica com a Equipa Externa CEDRU e PATER, através da plataforma *zoom*, e teve como principal objetivo a apreciação final do relatório da Fase IV, sobre a estratégia de adaptação e definições de opções, e reflexão sobre os conteúdos do resumo do PMAAC VFX destinado a publicação.
- ✓ **31.05.2023** – Entrega, por parte da equipa CEDRU, do Relatório Final do PMAAC VFX (Fase V);
- ✓ **17.07.2023** – Aceitação do Relatório Final do PMAAC VFX (Fase V);

3. ATIVIDADE 2 – Implementação do Plano de Comunicação

As tarefas associadas à Atividade 2 – Implementação do Plano de Comunicação, e fazendo uma analogia com as rubricas orçamentais, são, para além das ações de comunicação derivadas dos seminários de lançamento e final do Projeto, a execução de um vídeo promocional, aquisição de postais plantáveis e de kit de divulgação para atividades e promoção do projeto, assim como serviços de tradução e impressão de resumo do PMAAC VFX, previstos no plano de comunicação aprovado.

3.1. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO. SEMINÁRIOS (2)

- ✓ **25.11.2021** – I Seminário de Lançamento do PMAAC VFX¹. Auditório Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira
- ✓ **31.05.2023** – II Seminário Final do PMAAC VFX². Auditório Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3.2. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO. WORKSHOPS DE CAPACITAÇÃO COM ATORES ESTRATÉGICOS LOCAIS E TÉCNICOS MUNICIPAIS (4)

- ✓ **08.04.2022** - 1ª Sessão Intersectorial³ | workshop com técnicos municipais, realizado na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira para apresentação do cenário base de adaptação, contextualização climática, riscos, identificação e avaliação de impactos e vulnerabilidades climáticas atuais e futuras para o município.
- ✓ **03.05.2022** - 2ª Sessão Intersectorial⁴ | workshop com atores estratégicos locais, realizado no Salão Nobre da Quinta Municipal da Piedade na Póvoa de Santa Iria para apresentação do cenário base de adaptação, contextualização climática, riscos, identificação e avaliação de impactos e vulnerabilidades climáticas atuais e futuras para o município.
- ✓ **14.11.2022** - 3ª Sessão Intersectorial | workshop com técnicos municipais, realizado na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira para apresentação da estratégia de adaptação e abordagem operativa seguida de debate sobre a adaptação nos territórios vulneráveis

11

¹ <https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/photos/a.108379587414432/443179700601084/>

<https://www.instagram.com/p/CWk19DAq6M9/>

<https://www.cm-vfxira.pt/municipio/comunicacao/noticias/arquivo/2021/noticia/seminario-marca-lancamento-do-plano-municipal-de-adaptacao-as-alteracoes-climaticas>

² <https://www.instagram.com/p/CtuMHuQtcEM/>

<https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/posts/pfbid0h7nVAvXjYGox13BKchoVeZCzrCW4hvtTb2AhH979da6UK61Hhmf2c22pcPLvdKaPl>

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, seminário de encerramento do projeto decorreu a 30 de maio - Município de Vila Franca de Xira (cm-vfxira.pt)

³ Adaptação às Alterações Climáticas: Análise e definição de estratégias junta atores locais - Município de Vila Franca de Xira (cm-vfxira.pt)

<https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/posts/pfbid02chNVvEzF5eu85UcGRm4XgefhaDQva1R8RoUJumVMkKvFfoZ6KFntj1qscB15VTSI>

<https://www.instagram.com/p/Cd78i8jKH89/>

⁴ idem

prioritários para os riscos climáticos ondas de calor, cheias rápidas e cheias progressivas e subida do nível médio do mar.

- ✓ **13.01.2023** – 4ª Sessão Intersetorial⁵ | workshop com atores estratégicos (técnicos municipais e atores locais), realizado na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira para apresentação da estratégia de adaptação e abordagem operativa seguida de debate sobre a adaptação nos territórios vulneráveis prioritários para os riscos climáticos incêndios e secas.

3.3. OUTRAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

- ✓ **14.04.2021** – Desenvolvimento da imagem comunicacional do Projeto [Franc@d.PTação](#) para disseminação de vários suportes, em articulação e cumprimento com o “Manual de Comunicação e de Normas Gráficas EEAGrants Portugal 2014-2021, tendo o mesmo sido apresentado na 2ª reunião de acompanhamento com o Operador do Programa (SGA);
- ✓ **Março 2021** – Início da parceria do [Franc@d.PTação](#) com o projeto internacional *Walk to Global Walk*, para a concretização da atividade “Planta uma Ideia neste Postal”, envolvendo alunos de 9 agrupamentos e de Escolas não agrupadas do concelho de Vila Franca de Xira.
- ✓ **30.05.2022** – Entrega dos postais plantáveis no âmbito da atividade “Planta uma Ideia neste Postal”⁶, na Escola EB 2,3 Pedro Jacques de Magalhães, Alverca do Ribatejo;
- ✓ **24.10.2022** – Parceria na realização da atividade Projeto ERASMUS MAIS – *Sustainability for our future* na EB Pedro Jacques de Magalhães, Alverca do Ribatejo. O Projeto [Franc@d.PTação](#), em resposta à solicitação do estabelecimento de educação colaborou nas atividades de receção dos alunos (*peddy paper*) mais uma ação de divulgação do PMAACVFX, junto dos alunos e professores do projeto;
- ✓ **Janeiro e fevereiro 2023** - Divulgação do Projeto [Franc@d.PTação](#) na Revista VFX⁷, n.º1, bimestral, tiragem de 74.000 exemplares;
- ✓ **07.03.2023** – Lançamento dos 3 vídeos de promoção do Projeto [Franc@d.PTação](#) no *Kickoff Breakfast* do Projeto STOP DeserteJO⁸;
- ✓ **09.03.2023** – Parceria na realização da atividade Projeto ERASMUS+ – *Together for Sustainable Development Goals*, Meeting in Lisbon, 6-10 março 2023 na Escola Secundária do Forte da Casa. O projeto [Franc@d.PTação](#), em resposta à solicitação do estabelecimento de educação colaborou, na semana de trabalho junto dos alunos do Erasmus+ com uma ação de divulgação do PMAAC VFX, junto dos alunos e professores do projeto.

⁵ https://m.facebook.com/camaramunicipalvfx/photos/a.108379587414432/729693215283063?_rdr
https://www.instagram.com/p/CoDG_5Nko2/

⁶ “Planta uma Ideia neste Postal”: Alunos semeiam postais com sementes de flores - Município de Vila Franca de Xira (cm-vfxira.pt)
<https://www.instagram.com/p/CejUiFTrOzD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
<https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/photos/a.108379587414432/567671601485226/?type=3>

⁷ https://www.cm-vfxira.pt/cm-vfxira/uploads/document/file/5123/revista_vfx_1.pdf

⁸ <https://www.instagram.com/p/Cpf6enKITqc/>
<https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/posts/pfbid0299GeL2XhioANhcwwtWmJTULnZcE1ZTRiPKM1p4t1aYBd6Xet4RTCQkjh1NHSj94JI>

- ✓ **Março 2023** – Divulgação nas redes sociais⁹ dos 3 vídeos promocionais do Projeto Franc@d.PTação (versão PT e EN);
- ✓ **14 a 17.03.2023** – MIPIM 2023. *Palais des Festivals*, Cannes, França. O Município de Vila Franca de Xira esteve presente nesta feira internacional do setor imobiliário, com exposição no *stand* da região de Lisboa, onde entre outras peças, foram divulgados os vídeos de promoção do PMAAC VFX (versão EN).
- ✓ **21.03.2023** – “*Sessão na Escola. O Clima e a Adaptação*” – Atividade na Escola Básica e Secundária Professor Reynaldo dos Santos¹⁰ que juntou 100 alunos do 12º ano para debater as medidas de adaptação às alterações climáticas para Vila Franca de Xira.
- ✓ **22.04.2023** – No âmbito das comemorações do Dia da Terra, o Município de Vila Franca de Xira realizou junto de 70 escuteiros uma ação de sensibilização dinâmica e ativa, para alertar os mais novos escuteiros para a necessidade de defesa e preservação da biodiversidade e despertar consciências para o problema da poluição. Nesta iniciativa foi também divulgado o Projeto [Franc@d.PTação](#), nomeadamente o *Plano de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Franca de Xira*;
- ✓ **Maio e junho 2023** - Divulgação (antes) do Seminário de Encerramento na Revista VFX¹¹, Edição de Maio/ Junho e na página web do Município.
- ✓ **06.05.2023** – *Assembleia Municipal Jovem*¹². Mais de meia centena de jovens assumiram o papel de deputado municipal por um dia, em mais uma edição da Assembleia Municipal Jovem. Sob o tema "Ser Jovem em Vila Franca de Xira: que desafios? que soluções?". A iniciativa pretende sensibilizar para a importância da participação cívica e fomentar essa vertente junto dos mais jovens. Nesta iniciativa foi divulgado o Projeto Franc@d.PTação, nomeadamente o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Franca de Xira.

13

⁹ <https://www.instagram.com/p/Cp3TpZVlARA/>
<https://www.instagram.com/p/CptAlH0PN3U/>
<https://www.instagram.com/p/CpyJONiQqCO/>
<https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/videos/6030104513734297>
<https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/videos/3923273374565714>
<https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/videos/544898897754922>
<https://www.youtube.com/watch?v=m3YQOhxaQPU>
<https://www.youtube.com/watch?v=yIsnF4eCCwQ>
https://www.youtube.com/watch?v=5rpzY_e_U-E
https://www.youtube.com/watch?v=boQncu5_LT4
<https://www.youtube.com/watch?v=K8kVo3U5GDM>
<https://www.youtube.com/watch?v=zG7MwuEkW0>

¹⁰ <https://www.instagram.com/p/CqQaHeuljq0/>
<https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/posts/pfbid02svrMoFNZ4cEdkYsMRC8HbudirB2xLCVYDMWn32XpZnKUzM2Hsr3tiUGUhoQYaBYPI>

¹¹ [revista_vfx_3.pdf \(cm-vfxira.pt\)](#); Seminário de encerramento do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas - Município de Vila Franca de Xira ([cm-vfxira.pt](#))

¹² https://www.instagram.com/p/Cr_DKW9tVEB/
<https://www.facebook.com/camaramunicipalvfx/photos/a.108379587414432/785340166385034/>

- ✓ **03.06.2023** – Comemoração do Dia da Criança, na Quinta Municipal da Piedade. O Projeto Franc@d.PTação participou com uma ação de sensibilização sobre a temática das alterações climáticas, junto do público mais jovem, através de um jogo gigante, cujas perguntas são sobre Sustentabilidade e Alterações Climáticas;



Figura 3 – Jogo gigante sobre Sustentabilidade e Alterações Climáticas, Dia da criança, 03.06.2023

14

- ✓ **06.06.2023** – Enviado *email* de agradecimento a todos os participantes no Seminário de Encerramento do PMAAC VFX (30 de maio de 2023), com envio de certificado de participação, apresentação PMAAC VFX (CEDRU) e o link¹³ para um breve questionário;
- ✓ **12.06.2023 a 13.06.2023** – Participação de dois elementos da equipa no *II Forum EU Mission Adaptation to Climate Change*, em Roneby (Suécia), onde houve oportunidade de divulgar o Projeto [Franc@d.PTação](https://www.cm-vfxira.pt), concretamente o PMAAC VFX e respetivas medidas de adaptação;

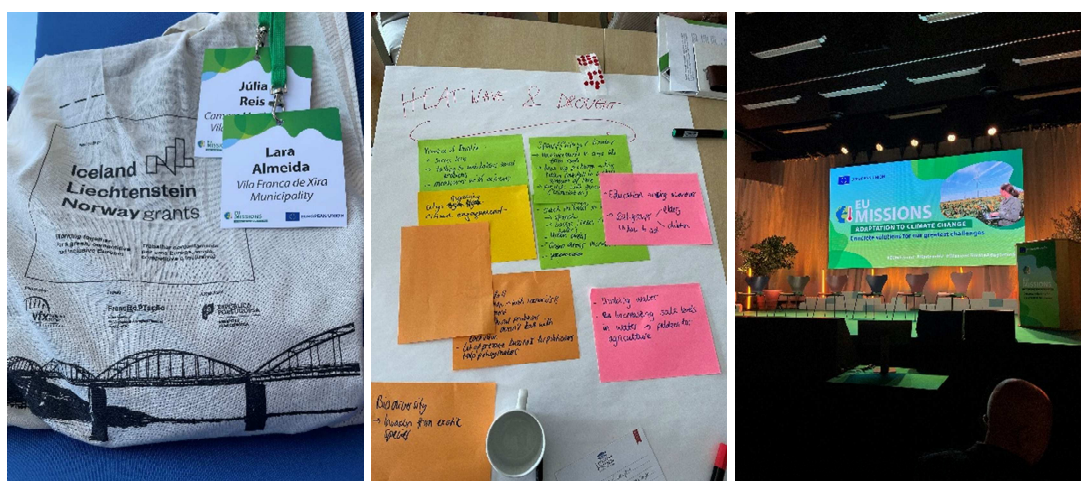


Figura 4 – II Forum EU Mission Adaptation to Climate Change, Roneby (Suécia)

¹³ <https://www.cm-vfxira.pt/pages/5012>

- ✓ **Junho 2023** – Apuramento do questionário de satisfação sobre o Seminário de Encerramento, durante o mês de junho. O questionário era composto por 11 perguntas, cujas pontuações - de 1 a 5, sendo que 5 era a pontuação mais alta. O apuramento do questionário revelou que os participantes do Seminário consideraram como avaliação global do II Seminário Encerramento do PMAAC VFX muito satisfatória (pontuação 4,46); <https://www.cm-vfxira.pt/pages/5012>





Figura 5 – Questionário de satisfação do Seminário de Encerramento do PMAAC VFX


- ✓ **Página WEB** – Disponibilização de informação sobre o Projeto Franc@d.PTação na página web¹⁴ do Município de Vila Franca de Xira;



¹⁴ [Alterações Climáticas - Município de Vila Franca de Xira \(cm-vfxira.pt\)](https://www.cm-vfxira.pt)

Figura 6 – Página Web do PMAAC VFX

- ✓ **Resumo do PMAAC VFX** – Impressão de um livro com dimensões 200x200mm, miolo com 144 páginas, papel reciclado 100grs e 250 exemplares;

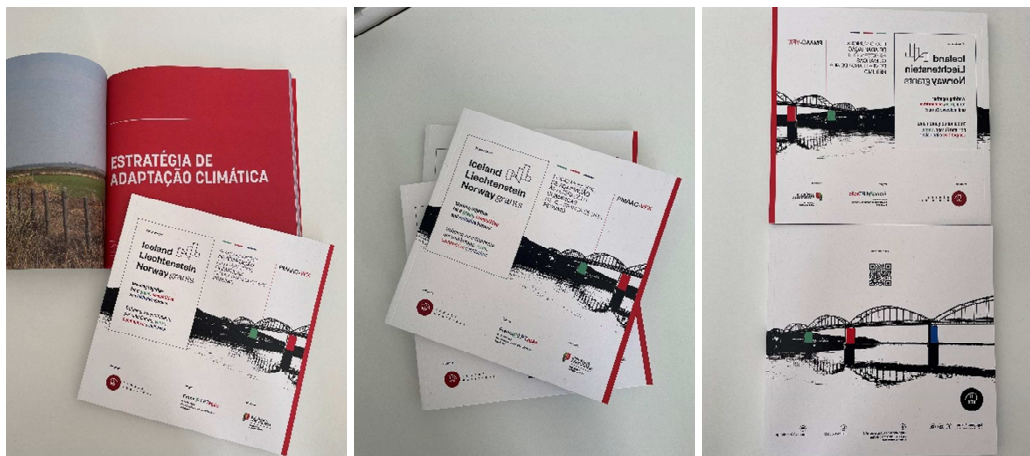Figura 7 – Publicação Resumo [Franc@d.PTação](#)

16

- ✓ **Materiais Pedagógicos** - Aquisição de um vídeo e jogo projetável para divulgação das alterações climáticas, junto do público escolar. São duas peças pedagógicas que se complementam e ajudarão nas atividades de sensibilização ambiental que o Município promove durante o ano letivo nas escolas do concelho;



Figura 8 – Jogo projetável para sala de aula



Figura 9 – Vídeo didático de apoio às ações de sensibilização sobre alterações climáticas

- ✓ Materiais de comunicação do Projeto [Franc@d.PTação](#) – Aquisição de Cadernos, tamanho A5 (blocos) feito a partir de caixas de leite recicladas, alusivos ao projeto.



Figura 10 – Cadernos pautados, tamanho A5

4. RESULTADOS ALCANÇADOS

Em anexo o cronograma com os agendamentos efetuadas das reuniões técnicas, sessões intersectoriais/ workshops e sessões públicas, durante os 30 meses do Projeto [Franc@d.PTação](#) (Anexo I)

4.1. TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO:

O Projeto [Franc@d.PTação](#) alcançou uma taxa física de 100% de concretização desde o 5º Relatório Intercalar (31.05.2023), todavia no mês de junho ainda houve lugar para a realização de uma ação de sensibilização, junto de crianças, com recurso ao Jogo Gigante sobre o tema das alterações climáticas, integrada na Comemoração do Dia da Criança, uma organização do Município de Vila Franca de Xira, onde participaram mais de 5.000 crianças, conforme melhor explicado e demonstrado na figura 3.

✓ Execução física do Projeto – **100%**

Indicadores de medida:

Quanto aos resultados alcançados com a implementação do Projeto durante o período de vigência do mesmo (30 meses), há a registar os seguintes valores:

DESIGNAÇÃO DO INDICADOR	RESULTADO
Nº de medidas e ações desenvolvidas num quadro de co-promoção a produzir em sessões intersectoriais/workshops, a realizar com os públicos-alvo selecionados	<ul style="list-style-type: none"> – Atividade “Planta uma ideia neste postal”; – I Seminário de Lançamento do PMAAC AML a 25.11.2021; – 1ª Sessão Intersectorial workshop com técnicos municipais (08.04.2022); – 2ª Sessão Intersectorial workshop com atores estratégicos locais (03.05.2022); – Entrega de postais plantáveis - Atividade “Planta uma Ideia neste Postal” (30.05.2022); – 3ª Sessão Intersectorial <i>workshop</i> com técnicos municipais (14.11.2022); – 4ª Sessão Intersectorial <i>workshop</i> com atores estratégicos locais (13.01.2023); – Atividade ERASMUS MAIS – <i>Sustainability for our future</i> (24.10.2022); – II Seminário Encerramento PMAAC VFX (30.05.2023); – Divulgação do projeto na Revista VFX de janeiro/fevereiro; – Lançamento e divulgação dos vídeos promocionais (07.03.2023); – Colaboração no Projeto ERASMUS MAIS – <i>Together for Sustainable Development Goals</i>, (09.03.2023); – Divulgação dos vídeos promocionais no MIPIM 2023. <i>Palais des Festivals</i>, Cannes, França; – “Sessão na Escola. O Clima e a Adaptação” (21.03.2023); – Comemorações do Dia da Terra (22.04.2023); – Assembleia Municipal Jovem (06.05.2023); – Divulgação do projeto na Revista VFX de maio/junho; – Comemoração do Dia da Criança (03.06.2023);

DESIGNAÇÃO DO INDICADOR	RESULTADO
Nº de indivíduos abrangidos por ações de comunicação – 41.000 (30% da população do MVFX)	<ul style="list-style-type: none"> – Público-Alvo envolvido na Atividade “Planta uma ideia neste postal” – 1.288 alunos; – Público-Alvo abrangido pelas notícias nas redes sociais – 2.071 pessoas alcançadas; – Público-Alvo presente no I Seminário de Lançamento do PMAAC AML a 25.11.2021– 87 presenças; – Público-Alvo abrangido pelas notícias nas Redes Sociais – 7083 visualizações – Público-Alvo presente 1ª Sessão Intersectorial – 24 presenças; – Público-Alvo presente 2ª Sessão Intersectorial – 35 presenças – Público-Alvo (estudantes e postais utilizados na Atividade “Planta uma Ideia neste Postal”) – 700 – Público-Alvo abrangido pelas notícias nas Redes Sociais das duas sessões intersectoriais – 3.917 pessoas alcançadas – Público-Alvo presente 3ª Sessão Intersectorial – 29 presenças; – Público-Alvo presente 4ª Sessão Intersectorial – 33 presenças – Público-Alvo (ERASMUS MAIS – <i>Sustainability for our future</i>) – 50 alunos – Público-Alvo abrangido pelas notícias nas Redes Sociais - 2.200 (Postal) pessoas alcançadas – Divulgação projeto na Revista VFX: 74.000 – Sessão de Encerramento – 61 participantes – Lançamento e divulgação dos vídeos promocionais – Colaboração no Projeto ERASMUS MAIS – <i>Together for Sustainable Development Goals</i> – 80 alunos – “Sessão na Escola. O Clima e a Adaptação” - 100 alunos – Comemorações do Dia da Terra – 70 participantes – Assembleia Municipal Jovem – 60 participantes – Divulgação do projeto na Revista VFX de maio/junho – 74.000 exemplares; – Público-Alvo abrangido pelas notícias nas Redes Sociais e visualizações dos vídeos no Youtube: 23.766 – Comemoração do Dia da Criança

19

Relativamente aos **resultados acumulados** com a implementação do Projeto Franc@d.PTação, registaram-se os valores abaixo, que demonstram que o projeto superou os indicadores contratualizados:

DESIGNAÇÃO DO INDICADOR	RESULTADO
Nº de medidas e ações desenvolvidas num quadro de co-promoção a produzir em sessões intersectoriais/workshops, a realizar com os públicos-alvo selecionados	18
Nº de indivíduos abrangidos por ações de comunicação – 41.000 (30% da população do MVFX)	189.654 indivíduos

4.2. TAXA DE EXECUÇÃO TÉCNICA

Na última validação local, a 25.05.2023, o auditor solicitou o cálculo da taxa de execução técnica do Projeto Franc@d.PTação e que essa informação fosse acrescentada nos futuros relatórios, tendo sido introduzida a partir do 5º Relatório Intercalar.

Em resposta ao solicitado, acrescentou-se a taxa de execução técnica, conforme se observa no quadro infra. O cálculo teve por base os indicadores contratualizados, o faseamento do PMAAC VFX, os Workshops e Seminários e também as tarefas previstas, nomeadamente na atividade 2, a mais difícil de quantificar, optou-se por elencar as tarefas com reflexo direto no orçamento.

Esta taxa não tem termo de comparação nos relatórios intercalares anteriores, na medida em que só foi solicitada à equipa CMVFX no passado dia 25.05.2023.

Como se verifica a taxa de concretização da execução técnica é de 100%.

20

ATIVIDADE 1 ELABORAÇÃO PMAAC VFX	Fase I. Contextualização, objetivos, metodologia, organização e quadro de referência estratégico do PMAAC VFX	
	Fase II. Definição da cenarização bioclimática de base de adaptação para o MVFX	
	Fase III. Caracterização de impactes e vulnerabilidades atuais e futuras para o MVFX	100%
	Fase IV. Estratégia municipal de adaptação e definição de opções e medidas por setor estratégico	
	Fase V. Modelos e instrumentos de gestão, acompanhamento e monitorização do PMAAC VFX	
ATIVIDADE 1 WORKSHOPS (PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA)	Workshop # 1 08.04.2022	
	Unidades orgânicas do Promotor	
	Workshop # 2 03.05.2022	
	Instituições de Utilidade Pública, Tecido Empresarial e Municípios Limítrofes	100%
	Workshop # 3 14.11.2022	
	Unidades orgânicas do Promotor e atores estratégicos	
	Workshop # 4 13.01. 2023	
	Unidades orgânicas do Promotor e atores estratégicos	

ATIVIDADE 2 IMPLEMENTAÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO (AÇÕES DE RELAÇÕES PÚBLICAS E SENSIBILIZAÇÃO)	Seminário de Apresentação 25.11.2021 - Envolvimento e sensibilização para a elaboração do PMAAC-VFX, Riscos e Vulnerabilidades	100%
	Seminário de Encerramento 30.05.2023 - Apresentação do Plano, atividades e resultados alcançados	
ATIVIDADE 2 IMPLEMENTAÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO (AÇÕES DE COMUNICAÇÃO)	Endereço email	100%
	Kit divulgação	
	Vídeos promocionais	
	Folhetos em postal plantável	
	Ações junto da comunidade escolar	
	Divulgação nas redes sociais do município	
	Página Web PMAAC VFX	
	Resumo do PMAAC VFX (PT)	
	Tradução do Resumo do PMAAC VFX (EN) versão digital	

5. DESCRIÇÃO DOS CUSTOS E AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO

As descrições dos custos reportam às aquisições efetuadas durante os 30 meses do Projeto Franc@d.PTação e a avaliação do impacto financeiro assente nos cinco pedidos de pagamento (PP) submetidos ao Operador do Programa (SGA), tal como se demonstra de seguida.

5.1. TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Detalha-se as despesas do Projeto Franc@d.PTação no decorrer da sua vigência, conforme as rubricas orçamentais e pedidos de pagamento efetuados:

Pedido de Pagamento PP1: 5.302,16€

- ✓ Gestão do Projeto: Aquisição de equipamento informático (3.690,00€);
- ✓ Atividade 1: -
- ✓ Atividade 2: Aquisição de componentes informáticos a utilizar na criação de *layouts* para produtos e suporte comunicacionais (1.612,16€)

Pedido de Pagamento PP2: 47.513,55€

- ✓ Gestão do Projeto: Recursos humanos (8.710,96€)
- ✓ Atividade 1: Fase I PMAAC VFX (16.260,60€); Fase II PMAAC VFX (16.260,60€); Aquisição dados climatológicos (64,59€); Encargos com *workshops* (485,0€);
- ✓ Atividade 2: Kit divulgação (2.337,0€); Kit divulgação (3.394,80€);

Pedido de Pagamento PP3: 11.010,61€

- ✓ Gestão do Projeto: Recursos humanos (9.715,42€)
- ✓ Atividade 1: -
- ✓ Atividade 2: Aquisição copos e garrafas (460,02€); Artigos para atividade “planta uma ideia neste postal” (835,17€);

Pedido de Pagamento PP4: 31.162,40€

- ✓ Gestão do Projeto: Recursos humanos (6.771,50€)
- ✓ Atividade 1: Fase III PMAAC VFX (24.390,90€)
- ✓ Atividade 2: -

22

Pedido de Pagamento PP5: 71 235,89€ (a submeter durante o mês de agosto 2023)

- ✓ Gestão do Projeto: Recursos humanos (17.834,37€); Viagem e alojamento (1.750,0€); Aquisição de equipamento informático (3.746,58€);
- ✓ Atividade 1: Fase IV PMAAC VFX (16.260,60€); Relatório Final do PMAAC VFX (8.130,30€); Aquisição de materiais pedagógicos ar livre e sala de aula (5.350,5€); Serviços de *graphic recording* para a Sessão de Encerramento (916,35€) e aquisição de materiais para ações de sensibilização (cadernos A5) (1.159,28€); Aquisição de materiais para ação sensibilização (168,80€);
- ✓ Atividade 2: Produção de 3 vídeos promocionais (6.150,0€); Serviço catering (720,0€); Materiais promocionais (2.804,40€); Serviços de tradução (3.630,96€); Impressão de resumo do PMAAC VFX (2.613,75€).

O quadro seguinte indica a taxa de execução financeira do Projeto [Franc@d.PTação](#), por atividade e total:

Taxa de Execução Financeira / Atividade	1º PP (€)	2º PP (€)	3º PP (€)	4º PP (€)	5º PP (€)	Total dos PP	Total contrato/ por rubrica (€)	Concretização (%)
Gestão de Projeto (29%)	3 690,00	8 670,96	9 715,44	6 771,50	23 330,95	52 178,85	47 707,04	31,72
Atividade 1 (50%)	0,00	33 110,79	0,00	24 390,90	31 985,83	89 487,52	89 167,59	50,18
Atividade 2 (21%)	1 612,16	5 731,80	1 295,17	0,00	15 919,11	24 558,24	25 175,55	20,49
Totais	5 302,16	47 513,55	11 010,61	31 162,40	71 235,89	166 224,61	162 050,18	102,38

23

6. DESCRIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS GERAIS DOS EEA GRANTS E DO 'PROGRAMA AMBIENTE'

O Projeto [Franc@d.PTação](#) que consiste na elaboração do PMAAC VFX procura, com a construção de um instrumento de planeamento orientador e operativo, consolidar as bases para a intervenção municipal em matéria de redução da vulnerabilidade climática.

O PMAAC VFX assenta em três Objetivos Estratégicos (OE):

1. Aumentar a capacidade de adaptação tornando o Município mais resiliente;
2. Identificar as medidas e ações de adaptação a concretizar ao nível municipal;
3. Partilhar e disseminar a informação formando uma comunidade mais sensível e consciente para esta temática.

Estes OE encontram-se alinhados com os objetivos do Programa Ambiente Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono, em particular com o que visa *“aumentar a resiliência às alterações climáticas, através de medidas concretas de adaptação a nível local, e soluções tecnológicas de baixo carbono e de mitigação às alterações climáticas em cidades”*.

24

Por outro lado, a Estratégia pensada para o PMAAC VFX é coerente com o quadro estratégico nacional em razão de matéria de política climática, materializada pela Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAA 2020) cujos objetivos visam: (i) melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; (ii) implementar medidas de adaptação; (iii) promover a integração da adaptação em políticas sectoriais.

O grau de alinhamento com o Programa de Ação para Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), que visa concretizar o 2º objetivo da ENAA 2020, é igualmente elevado, na medida em que o planeamento municipal de adaptação é a escala mais adequada para priorizar medidas, ações e investimentos de carácter mais estrutural, com vista à construção de uma comunidade melhor adaptada às alterações climáticas.

O PMAAC VFX alinha-se com a Agenda Metropolitana de Adaptação que consta do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC AML), de fevereiro 2020, que tem um quadro estratégico de atuação propositivo por risco climático de adaptação prioritário, suportado em medidas e ações.

A nível local, o PMAAC VFX irá articular-se com o planeamento em curso, a saber: Plano Municipal de Ambiente e o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima, decorrente da adesão do Município de Vila Franca de Xira ao Pacto dos Autarcas em 2019, este último ainda em elaboração.

Os objetivos estratégicos do PMAAC VFX são também convergentes com os objetivos da política do clima constantes da Lei de Bases do Clima, publicada pela Lei n.º 98/2021 de 31 de dezembro,

nomeadamente os objetivos de “*reforçar a resiliência e a capacidade nacional de adaptação às alterações climáticas e de estimular a educação e o conhecimento para a promoção de uma transição rápida e socialmente equilibrada*”, entre outros. De entre os princípios da política do clima definidos pela Lei de Bases destaca-se o alinhamento com os princípios da “*valorização do conhecimento e da ciência; da subsidiariedade, assente numa administração multinível integrada e eficiente, integrando as autarquias nos processos de planeamento, tomada de decisão e avaliação das políticas públicas, da informação, impondo uma cultura de transparência e responsabilidade; da participação, incluindo os cidadãos e as associações ambientais no planeamento, tomada de decisões e avaliação das políticas públicas*”.

Por fim, referir que a concretização do Projeto [Franc@d.PTação](#) será determinante para os resultados a alcançar pelo *Programa Ambiente Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono* (segundo o aviso de candidatura), na medida em que o PMAAC VFX beneficia uma população de 136.886 indivíduos (total da população do concelho de Vila Franca de Xira segundo o Censos 2011), contribuindo com 5,3% para a meta de 2.600.000 pessoas, assim como o território de Vila Franca de Xira passará a dispor de um PMAAC, contribuindo com 3,3% (1 Plano) face à meta dos 30 Municípios.

Em face do acima exposto, conclui-se que o Projeto [Franc@d.PTação](#) contribuiu com os seus resultados para os objetivos a alcançar pelo Programa Ambiente Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono, na medida em que superou os indicadores contratualizados, conforme se demonstrou no presente Relatório Final.

O Promotor do Projeto - Município de Vila Franca de Xira

Nome	Marina Tiago
Data e Assinatura	
Posição	Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

O Operador do Programa – Secretaria Geral do Ambiente

Nome	Marco Rebelo
Data e Assinatura	
Posição	Secretário-Geral

26

Vila Franca de Xira, 07 de agosto de 2023

ANEXO I

Anexo I
PROJETO 08_SGS#3
Franc@d.PTação – Município de Vila Franca de Xira

c) Cronograma - Relatório Final

Área de Intervenção/ Program Area	ID Atividade/ Activity ID	Descrição Atividade/ Activity Description	Indicador/ Indicator	Promotor/ Parceiro - Promoter/ Partner	2020												2021												2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Área Prioritária A - escala local	1	A ELABORAÇÃO do PMAAC-VFX ¹	Nº de medidas e ações desenvolvidas num quadro de co-promoção, a produzir em sessões intersectoriais / workshops, a realizar com o público-alvo	MVFX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

¹ - Integrará a reflexão desenvolvida com a execução do PMAAC-AML vertendo, com a devida pormenorização, as medidas e ações por risco climático, corporizadas na Agenda Metropolitana de Adaptação. O PMAAC-VFX contribuirá para o aumento da capacidade de adaptação, tornando o MVFX mais resiliente, identificando medidas e ações de adaptação a concretizar a nível setorial. De forma planeada, concertada e consciente, as intervenções locais que vier a programar, cumprirão os desígnios da abordagem adequada às suas especificidades territoriais, da seguinte forma: DIAGNÓSTICO da situação atual, incluindo a identificação de riscos e vulnerabilidades atuais e futuras, face a diferentes cenários climáticos, utilizando cumulativamente a informação disponibilizada pelo portal do clima; IDENTIFICAÇÃO de OPÇÕES e de MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO e sua priorização; IDENTIFICAÇÃO das principais UNIDADES ORGÂNICAS da estrutura organizacional do MVFX e ENTIDADES Públicas e Privadas a envolver na implementação e acompanhamento; CRONOGRAMA de IMPLEMENTAÇÃO de medidas e ações; CUSTOS e FONTES DE FINANCIAMENTO; FICHAS DE PROJETO, com descrição das medidas, detalhe das ações e INDICADORES DE EXECUÇÃO; SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO das medidas e ações.




² - Divulgação e disseminação do PMAAC-VFX, em cumprimento do Manual de Comunicação e de Normas Gráficas do EEA Grants Portugal 2014-2021 e em linha com o objetivo III da ENAAC: participar, sensibilizar, divulgar e suscitar um elevado grau de envolvimento e participação. Os PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO previstos são: spots promocionais de divulgação; notícias na comunicação social; redes sociais; site do Município, mailings, newsletters, boletim municipal, kit de divulgação; publicação resumo do PMAAC-VFX. As AÇÕES DE COMUNICAÇÃO previstas são: 2 Sessões Públicas - 1ª Lançamento e Apresentação - Envolvimento e sensibilização para a Elaboração do PMAAC-VFX, Riscos Impactos e Vulnerabilidades - 2ª Apresentação dos resultados do PMAAC-VFX

Anexo I
PROJETO 08_SGS#3
Franc@d.PTação – Município de Vila Franca de Xira

c) Cronograma - Relatório Final

Atividade 1_ATV1*		Preparação do concurso público, para contratação de equipa externa com vista à Elaboração do PMAAC-VFX
		Elaboração do PMAAC-VFX, acompanhamento através de 6 reuniões técnicas entre equipas e 4 workshops / Sessões Intersetoriais. Elaboração de Relatórios Intercalares e reportes para alimentar o Sistema de Avaliação e Monitorização - SAM do PMAAC-VFX.
		Finalização do processo, elaboração do Resumo do PMAAC-VFX e do Relatório Final da candidatura
Atividade 2_ATV2*		Criação de layouts e preparação dos Suportes de Comunicação / Ajustamento dos conteúdos comunicacionais - Spots Promocionais
		Implementação do Plano de Comunicação - divulgação dos produtos de comunicação e realização das 2 Sessões Públicas
		Finalização do Processo, publicação do Resumo do PMAAC-VFX, Relatório Final da candidatura.

* A "Gestão do Projeto" constante em maior detalhe no Budget _ separador D da plataforma_ promoverá a concretização transversal e simultânea de todas das atividades_ATV's previstas

-  Reuniões Técnicas entre a equipa promotora e a equipa do projeto durante a Elaboração do PMAAC-VFX
-  Sessões Intersetoriais / workshops
-  Sessões Públicas
